


ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 โครงการ)

ประจำเดือน	รายการค่าก่อสร้าง			รายการค่าควบคุมงาน			หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน	งบประมาณที่ได้รับ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน	
ต.ค. 66	2,903,938,836.00	0.00	0.00	108,395,800.00	1,444,000.00	14.49	1) เดือน ต.ค. 66 สอจ.พะเยา เบิกค่าควบคุมงาน
พ.ย. 66	2,903,938,836.00	70,558,013.25	33.27	108,395,800.00	1,902,920.00	19.09	จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ธ.ค. 66	2,742,161,336.00	23,122,993.13	10.90	103,372,400.00	1,639,950.00	16.45	พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ม.ค. 67	2,742,161,336.00	33,026,572.14	15.57	103,372,400.00	846,195.00	8.49	2) ต.ค. - พ.ย. 66 จำนวน 25 โครงการ
ก.พ. 67	2,742,161,336.00	22,412,833.90	10.57	103,372,400.00	2,810,640.00	28.20	3) ธ.ค. 66 จำนวน 24 โครงการ (โครงการก่อสร้าง
มี.ค. 67	2,742,161,336.00	62,938,694.53	29.68	103,372,400.00	1,323,480.00	13.28	อาคารสอภ.4 ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงิน
เม.ย. 67							เรียบร้อย
พ.ค. 67							4) มี.ค. 67 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
มิ.ย. 67							อัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพัก
ก.ค. 67							และสิ่งก่อสร้างประกอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ส.ค. 67							และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อย มี.ค. 2567
ก.ย. 67							
รวมเบิกทั้งสิ้น		212,059,106.95	100.00		9,967,185.00	100.00	

ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้าง

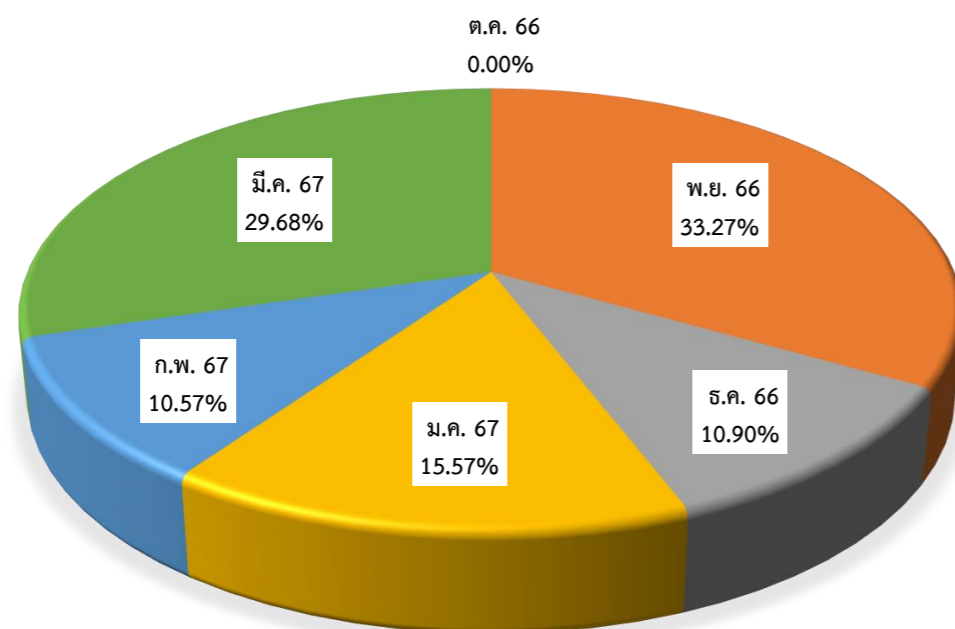

ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน ค่าควบคุมงาน

